


AVANCEMENT DES TRAVAUX - PROJET BROADWAY


DESCRIPTION_SOUS PROJETS	Montants octroyés	Travaux contingents réalisés
<i>RUE VICTORIA</i>	1 144 157.62 \$	
<i>AVENUE LAURENDEAU</i>	2 291 733.86 \$	
<i>AVENUE BROADWAY</i>	7 901 743.99 \$	
<i>PISTE CYCLABLE</i>	415 172.40 \$	
<i>PARC DE L'HÔTEL DE VILLE</i>	645 465.35 \$	
<i>CONDUITE DE L'AGGLOMÉRATION</i>	170 153.95 \$	
<i>SOUS-TOTAL</i>	12 568 427.17 \$	
CONTINGENCES 10%	1 256 842.72 \$	489 494.66 \$
SOUS-TOTAL	13 825 269.89 \$	
TPS (5%)	691 263.49 \$	
TVQ (9,975)	1 379 070.67 \$	
TOTAL	15 895 604.05 \$	

À la date du paiement du décompte no 10, les dépenses en travaux contingents représentent 3,89% le montant du contrat.

DÉPENSES TRAVAUX CONTINGENTS
vs MONTANT DES CONTINGENCES

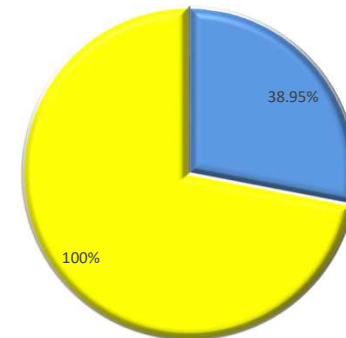

DÉPENSES DES TRAVAUX CONTINGENTS vs
MONTANT DU PROJET

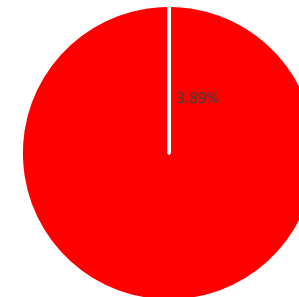

■ Pourcentage des travaux contingents par rapport au montant du contrat octroyé
